



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	smlouva o dílo		Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	dodávky	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5			Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9		
Předmět plnění *)	3	"Dodavatel interiérů pro stavbu CEITEC MU přístavba A4"					
Smlouvu předkládá	4	jméno	datum		podpis		
		Mgr. Vladimír Ficenec	11.4.2012				
Dodavatel/Odběratel *	6	název	IČO		DIČ		
		Apelov s.r.o.	26120534				
Účinnost smlouvy od - do	7	dnem podpisu smlouvy	S obnovením 3a				
			Avízo 3b				
Celková cena plnění (konečná cena)	8	321.453,- Kč vč. DPH					
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz text smlouvy					
Platební podmínky		viz text smlouvy					
Přechod vlastnictví		převzetím zboží					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka	Činnost	Pracoviště			
		1069	2195	710000			
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno	datum		podpis		
Vedoucí EO HS		jméno	datum		podpis		
		Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	11.4.2012				
Stanovisko EO HS		bez připomínek					
Schváli za Právo		jméno	datum		podpis		
		Mgr. Ing. Jaromír Šín	11.4.2012				
Stanovisko Právo		Bez připomínek					
Vedoucí OVZ		jméno	datum		podpis		
		Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	11.4.2012				
Stanovisko OVZ							
Příkazce operace		jméno	datum		podpis		
		prof. Jaroslav Koča	11.4.2012				
Správce rozpočtu		jméno	datum		podpis		
		Ing. Michal Marcolla	11.4.2012				
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum		podpis		

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen obchodní zákoník)

I.

Smluvní strany

Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - město,
85636621/0100
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D, MBA, kvestorem

(dále jen „Objednatel“)

a

Adelon s.r.o.

sídlo: Julia Mařáka 174, 250 01, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
bankovní spojení: Citibank Europe
číslo účtu: 8900068269/2600
IČ: 26120534
DIČ: CZ26120534
zastoupený: Petrem Altmanem, ředitelem na základě plné moci
zápis v OR: spisová značka C 71903 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že

Objednatel zamýšlí v rámci projektu „CEITEC – středoevropský technologický institut reg. č. CZ.1.05/1.1.00/02.0068 (dále jen „projekt“ nebo „CEITEC“), stavba CEITEC MU přístavba pavilonu A4“, vybavit nové prostory přístavby pro NMR a další nově rekonstruované prostory v 1.PP pro pracoviště NMR v pavilonu A4 v Univerzitním kampusu Brno – Bohunice, Kamenice 5, interiérovým vybavením (viz projektová dokumentace k interiéřům),

Zhotovitel předložil v zadávacím řízení nabídku, která byla Objednatelům vybrána jako nejvhodnější, smluvní strany sjednaly následující:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení pro projekt „CEITEC“. Součástí díla je rovněž:
- zpracování dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci interiérového vybavení, včetně jejího projednání a schválení generálním projektantem stavby projektu „CEITEC“ a Zhotovitelem zadávací projektové dokumentace interiérů.
 - koordinaci projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení díla
 - obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení
 - kompletaci nábytku z jednotlivých prvků (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného nábytkového kusu (nikoli prvku) a interiérového vybavení samolepkou s označením podle výkazu výměr z projektu (podle jednotlivých místností)
 - veškerá elektrická a jiná připojení interiérového vybavení na instalace nezbytná pro provoz a funkci interiérového vybavení včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla
 - předprovozní testy a uvedení vybavení do provozu
 - vypracování celkového seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny (v členění na položky hrazené z investičních a hrazené z neinvestičních zdrojů)
 - zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy
 - předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy
 - provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména všech částí stavby, v níž bude dílo prováděno) v průběhu provádění díla
 - opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučných rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění a příslušnou vyhláškou města Brna
 - součinnost s ostatními dodavateli pro projekt „CEITEC“ včetně spolupráce s Objednatelům při komplexním vyzkoušení a zaregulování provozních systémů majících vazbu na dodávku interiérového vybavení
 - dopravu veškerých interiérových prvků do místa plnění a jejich instalaci na místa dle projektové dokumentace interiérů.
- 1.2 Definici předmětu smlouvy, tj. díla, upřesňuje technická specifikace díla, která je obsažena v příloze 1 této smlouvy.

- 1.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je Objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými platnými předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci a plánu řízení a kontrole jakosti.
- 1.4 Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. Kromě ceny díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

2 CENA ZA DÍLO

- 2.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH 309 794 Kč (slovy: třístadevčtisíc sedmsetdevadesátčtyři)

sazba DPH 20 %

výše DPH 61 958,80,- Kč

cena s DPH 371 753,- Kč

(slovy: třístasedmdesátjednatísíc sedmsetpadesát tři)

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze 2 této smlouvy. Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako položkový rozpočet (oceněný výpis prvků, příp. označovaný také jako oceněný výkaz výměr) vychází z výpisu prvků, obchodních a technických podmínek stanovených Objednatel pro realizaci zakázky a projektové dokumentace pro výběr dodavatele předaných Objednatel Zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace veřejné zakázky.

- 2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, realizační a dílenskou dokumentaci, režii Zhotovitele a zisk Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZ a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění, znečištění, uložení (na skládce) nebo zneškodnění (ve spalovně) odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této smlouvy, apod. Dále cena obsahuje náklady na dopravu zboží na místo plnění, montáže, veškerou manipulaci se zbožím, organizační a koordinační činnost, náklady na opravu všech poškození budovy vzniklých při instalaci a dodávce interiérů a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace díla až po jeho protokolární předání.
- 2.3 Má se za to, že Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, a že při stanovení ceny díla, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy

- prověřil místní podmínky pro provedení díla,

- zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

2.4 Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenami v této smlouvě uvedenými ceny bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem, případně Objednatelem, účtována dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.5 Doklady určující cenu díla.

Cena díla je doložena oceněným výpisem prvků (položkovým rozpočtem). Zhotovitel odpovídá za to, že ocenění výkazu výměr je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků slouží k prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného zboží a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků jsou ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu Objednatele.

2.6 Cena díla dle článku 2.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, změna výše této ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že:

- Objednatel požádá o provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou specifikovány v příloze 1 (vícepráce), nebo že Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce);
- Objednatel požádá o změnu kvality nebo druhu dodávky oproti kvalitě a druhu specifikovaném v příloze 1.

2.7 Způsob sjednání změny ceny díla.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli ke schválení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny díla teprve v případě, že změna ceny díla bude schválena Objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí požadavek na zvýšení ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí důvody vedoucí ho k podání návrhu na zvýšení ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny díla.

2.8 Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli ke schválení.

Ocenění víceprací.

Na základě písemného soupisu víceprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané vícepráce s využitím počtu měrných jednotek nezbytných k provedení dané vícepráce a jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr; pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nejsou obsaženy, tak Zhotovitel zpracuje návrh kalkulace ceny dané vícepráce s využitím postupů a podmínek, za kterých byla kalkulována cena díla. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do pěti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

Ocenění méněprací.

Na základě písemného soupisu méněprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané méněpráce s využitím počtu neprovedených měrných jednotek a jednotkových cen podle oceněného výpisu prvků. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do pěti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.
- 3.2 Cena za dílo dle článku 2.1 této smlouvy včetně cen víceprací a méněprací sjednaných dle článku 2.8 této smlouvy bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla na základě dvou daňových dokladů (faktur), z nichž první bude zahrnovat pouze dodávky hrazené z investičních prostředků a druhý pouze dodávky hrazené z neinvestičních prostředků, vystavených Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění odpovídajícím dnu převzetí a předání díla, a to takto:
- 3.2.1 V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí Objednatel částku dle článku 3.2 této smlouvy v plné výši do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 3.2.2 V případě předání a převzetí celého díla s vadami a nedodělků uhradí Objednatel 85 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli. Zbývající část ve výši 15 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy bude tvořit zádržné, které Objednatel uhradí do 30 dnů po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.3 Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury Objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury držitelem poštovní licence či kurýrní službou na adresu Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vystavení faktury.
- 3.4 Faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku v platném znění. K faktuře budou přiloženy přílohy – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Objednatel a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno.
- 3.5 Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady.
- 3.6 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

4 LHŮTA PLNĚNÍ

- 4.1 Termínem zahájení se rozumí den podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu díla a výrobní práce na díle termínem zahájení.
- 4.2 Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve Objednatele k převzetí díla k tomuto datu.

4.3 Dnem předání a převzetí díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v termínu: do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy. Předpokládaný termín zahájení prací na instalaci a montáži jednotlivých prvků interiéru je od 4.5.2012.

Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením celého díla a jeho předáním se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze smlouvy časový plán realizace díla uvedený v příloze 3 smlouvy.

4.5 Podrobný časový plán montáže prvků v jednotlivých místnostech a ucelených částech předá Zhotovitel Objednateli písemně nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel má právo tento dokument připomínkovat, Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele v dokumentu respektovat. Podrobný časový plán montáže prvků se stane okamžikem schválení Objednatelem závaznou přílohou 3 smlouvy o dílo. Objednatel požaduje dodávku a instalaci pracovních stolů v m.č. 1S104 v co nejkratším termínu – optimálně do 28.5.2012.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem předání a převzetí díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4.7 Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

4.7.1 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele.

4.7.2 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně písemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

4.7.3 V případě zvýšeného objemu prací nad rozsah specifikovaný v zadávací dokumentaci veřejné zakázky o více než 10 % dle dohody v dodatku k této smlouvě.

Změna (prodloužení) termínu předání a převzetí díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

4.8 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den 24 hodin denně. Objednatel je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě obě strany v dodatku ke smlouvě sjednají změnu termínu předání a převzetí.

4.9 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy, nemají vliv na termín předání a převzetí díla sjednaný ve smlouvě.

4.10 Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů po dni zahájení ověřit soulad zařazení jednotlivých položek položkového rozpočtu (investiční x neinvestiční výdaje) s platnými předpisy a inventarizačními zásadami a v případě potřeby zařazení upravit. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny nejpozději 10 kalendářních dnů před dnem předání a převzetí díla a poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při zpracování čárových kódů dodaných položek a označení nábytku těmito kódy. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději 10 kalendářních dnů před dnem předání Objednateli soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů.

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA (STAVENIŠTĚ)

- 5.1 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zahájení montážních prací předáním staveniště. Předpokládaný termín předání staveniště je staveniště 4.5. 2012. Strany se mohou domluvit i na dřívějším předání stavby.
- 5.2 K převzetí staveniště vyzve Objednatel písemně Zhotovitele minimálně 3 kalendářní dny předem.
- 5.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami a generálním dodavatelem stavby.
- 5.4 V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště předal. Jde zejména o:
- vyznačení přístupových cest
 - vyznačení bodů pro napojení odběrného místa elektřiny či jiných médií.
 - Zhotovitel předá zástupci Objednatele technologické postupy montáže volných interiérů, do kterých budou zapracovány zásady a opatření v oblasti BOZP a protipožární opatření, zákresy půdorysů, přístupových komunikací, vyznačení místa ošetření a první pomoci.
- 5.5 Staveniště pro instalaci interiérového vybavení bude předáno formou předání jednotlivých místností určených pro instalaci interiérového vybavení. Staveniště pro instalaci specifického interiérového vybavení budou předána formou vymezení prostoru pro instalaci daného zařízení (místnost, ve které bude zařízení instalováno).

6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny Objednatele

- 6.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

- 6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných platných předpisů.
- 6.5 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy doklady o interiérovém vybavení nezbytné pro zahájení kolaudačního řízení (indexy šíření plamene aj.). Zhotovitel doloží nejpozději 10 dnů přede dnem předání a převzetí díla soubor atestů, certifikátů a

prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Realizační dokumentace, příprava výroby, vzorky, kompletace a instalace nábytku a interiérového vybavení

- 6.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování realizační dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s Objednatelem a autorským dozorem generálního projektanta, v termínech určených Objednatelem. Dokončenou realizační dokumentaci doloženou souhlasným stanoviskem autorského dozoru generálního projektanta předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení dodávek a montáže díla. Nejpozději do 10 dnů po dni podpisu smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli vzorky interiérového vybavení, které hodlá použít k dodávce díla, k ověření, zda navržené interiérové vybavení vyhovuje požadavkům Objednatele specifikovaným v příloze 1 Smlouvy. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze 1 smlouvy, je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli k novému posouzení a schválení. Zhotovitel bude v průběhu plnění díla respektovat podmínky stavebního povolení vztahující se k dodávce interiérového vybavení.

Kontrola provádění díla

- 6.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pracovních výborů, jejich četnost a termíny stanoví Objednatel v průběhu realizace díla. Provádění díla v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.
- 6.8 Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu Zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách.
- 6.9 Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení výzvy a seznámit Objednatele se stavem výroby.
- 6.10 O výsledcích kontrol dle tohoto článku bude vždy proveden zápis s ujednáním termínu k odstranění příp. nedostatků zjištěných v rámci této kontroly.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 6.11 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.
- 6.12 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

- 6.14 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 6.15 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 6.16 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody

- 6.17 Pokud je činností Zhotovitele způsobená škoda Objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 6.18 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

Možnost pověřit realizací části díla jinou osobu

- 6.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pouze s předchozím souhlasem Objednatel. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru subdodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 6.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy.

Předání a převzetí díla

- 6.21 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne stanoveného Zhotovitelem v oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady:
- seznam zařízení, která jsou součástí díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství v členění po jednotlivých místnostech a v členění na investiční a neinvestiční zařízení
 - atesty, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v díle
 - protokoly o revizích
 - návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy potvrzené Objednatelem (odpovědným zástupcem uživatele)
- Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady nebo nebudou-li požadované doklady zpracovány v požadovaném jazyce, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
- 6.22 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo instalovalo (staveniště).

- 6.23 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí ucelené části díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, autorský dozor, technický dozor, zástupce MŠMT, apod.).
- 6.24 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- 6.25 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou:
- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - soupis dodávek a prací, které je předmětem předání a převzetí ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Objednatелеm
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - popř. soupis vad a nedodělků dle článku 6.10 a 6.27 této smlouvy
- 6.26 Předáním díla, stvrzeným podpisy osob pověřených jednat za Objednatele a Zhotovitele na předávacím protokolu, přechází na Objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do dne předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle ve smyslu § 542 odst. 2, podle ust. § 455 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, Zhotovitel.
- 6.28 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Za nedodělek je přitom považováno mj. i neprovedení úklidu jednotlivých místností, v nichž bylo interiérové vybavení instalováno, oprav poškození místností vzniklých v průběhu montáže interiérového vybavení a odvozu odpadu. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou Objednatel a Zhotovitel v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě Objednatele a Zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí ucelené části díla.
- 6.29 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Součinnost s generálním dodavatelem stavby a přímými dodavateli Objednatele

- 6.29 Generální dodavatel stavby (GDS) poskytne Zhotoviteli informace o jeho povinnostech při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany, Zhotovitel strpí kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou GDS. Zhotovitel nebude při provádění díla bránit v plnění povinností GDS.
- 6.30 Generální dodavatel stavby protokolárně předá Zhotoviteli připravené místnosti k montáži interiéru a klíče od místností. V případě předání a převzetí stavby Objednatелеm budou prostory a klíče protokolárně předány Objednatелеm.
- 6.31 Zhotovitel je povinen koordinovat svůj postup při provádění díla s generálním dodavatelem stavby (budou-li dodávka a montáž prováděny v době, kdy dodavatel stavby bude ještě provádět práce na stavbě) a přímými dodavateli Objednatele (mj. dodavateli přístrojového vybavení). Zhotovitel je mj.

povinen umožnit generálnímu dodavateli stavby a přímým dodavatelům Objednatele vstup na staveniště a trpět provádění jejich prací a instalace jejich zařízení.

Manažer projektu

- 6.33 Manažer projektu je oprávněn kontrolovat provádění díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit; ustanovení § 551 obchodního zákoníku se použije. Manažer projektu je, mimo jiné, oprávněn požadovat:
- a) odstranění nebo nahrazení jakékoliv práce, technického vybavení, výrobku nebo materiálu, který nebude v souladu s touto smlouvou;
 - b) aby Zhotovitel ve stanovené lhůtě odvolal z prací na díle jakoukoli osobu zaměstnanou Zhotovitelem. Osoba takto odvolaná z provádění díla bude Zhotovitelem nahrazena, co nejdříve to bude možné.
- 6.34 Manažer projektu oznámí Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy.
- 6.35 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že manažer projektu nemá oprávnění měnit smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze smlouvy.
- 6.36 Manažer projektu je oprávněn zvolit si za sebe zástupce ve věcech týkajících se oprávnění pro něj vyplývajících z této smlouvy, zejména z čl. 6.33 až 6.35. Pro takové zmocnění stačí i ústní souhlas manažera projektu k zastupování v dané věci.

7 ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo ke dni předání a převzetí, a vady zjištěné v záruční lhůtě. Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělkami až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
- 7.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční lhůta stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 7.1. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělkami až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
- 7.3 Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období od převzetí a předání díla do začátku běhu záruční lhůty a v záruční lhůtě, Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele (reklamací). I reklamáce odeslaná Objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním nového plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
 - přiměřenou slevu z ceny díla
 - odstoupení od smlouvy
- Objednatel je oprávněn vybrat si kterýkoliv z uvedených způsobů odstranění vady.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně.

- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci do dvou pracovních dnů od jejího doručení, oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do pěti pracovních dnů od doručení reklamace. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je Zhotovitel povinen vadu odstranit – v takovém případě Zhotovitel písemně Objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- 7.6 Maximální termín pro odstranění vady je pět pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepiší Zhotovitel a Objednatel protokol, ve kterém podpisy oprávněných zástupců smluvních stran potvrdí odstranění vady.
- 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornit, ale ten na jejich použití písemně trval.
- 7.8 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené prokazatelným neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převímce nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil (např. při zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené prokazatelně hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
- 7.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 7.6 smlouvy nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. V případě vad a nedodělků z převímacího řízení, kdy Zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu Objednateli neuhradí, je Objednatel oprávněn použít k zapravení svého nároku zádržné dle článku 3.2.2 této smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

8 POJIŠTĚNÍ

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po termínu zahájení doklad prokazující, že Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 500 000,- Kč (slovy pětsettisíc korun českých) na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.

9 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 9.1 Zhotovitel je povinen v průběhu záruční lhůty provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné

výzvy Objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, zejména:

- seřízení všech pohyblivých částí díla, tj. dodaného zařízení a vybavení, jako jsou např. dvířka a zásuvky;
- kontrolu povrchů pracovních desek a jejich případnou opravu; atd.

9.2 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu pěti let ode dne uplynutí posledního dne záruční lhůty zabezpečit na výzvu Objednatele za úplaty pozáruční servis.

9.3 Zhotovitel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání Objednatelem, nestanoví-li Objednatel jinou lhůtu, odstranění poruch zařízení nejpozději do pěti pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.

10 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

10.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy plus DPH dle platných právních předpisů za každý i započatý den prodlení.

10.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy přesáhne 14 dnů, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy plus DPH dle platných právních předpisů za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

10.3 Bude-li vadou či nedodělkem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla absence některého atestu, certifikátu či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý chybějící atest, certifikát či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů a za každý den prodlení počínaje dnem předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní ostatní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla způsobem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, nejpozději však do pěti pracovních dnů od předání a převzetí díla, nebyl-li termín pro odstranění vady či nedodělku v protokolu o předání a převzetí díla uveden, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.4 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do tří kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady nebo vad, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

10.5 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.6 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty ujednané v této smlouvě v dvojnásobné výši.

10.7 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- 10.8 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.9 V případě, že Zhotovitel poruší předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární předpisy nebo provozní řád stavby a jiné instrukce Objednatelem pověřené osoby, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši:
- 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých)
- pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.)
- 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých)
- pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu
- 500,- Kč (pět set korun českých)
- za každé jednotlivé porušení předpisů BOZ nebo PO nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
- 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)
- za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na vadu až do jejího odstranění
- 10.10 Strana povinná musí uhradit vyúčtování sankce nejpozději do 14 dnů ode dne příslušného vyúčtování.
- 10.11 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 10.12 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele.

11 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- dojde k podstatnému porušení této smlouvy;
 - dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které Zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;
 - Zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu Objednatele respektovat pokyny Objednatele;
 - bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt „CEITEC – Středoevropský technologický institut reg. č. CZ.1.05/1.1.00/02.0068“;
 - Zhotovitel se dostane do úpadku.
- 11.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy Objednatelem.

12 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami.
- 12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

- 12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2027. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít
- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).
- ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídicímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.

- 13.2 Objednatel může být při plnění smlouvy zastoupen v plném rozsahu svých práv a povinností osobou najatou Objednatелеm, aby jednala jako manažer projektu či technický dozor stavebníka.

- 13.3 Dodavatel se zavazuje dodržet požadavky na publicitu programů strukturálních fondů i jiných zdrojů financování, které jsou stanovené Pravidly pro publicitu v rámci OP VaVpl (viz příloha 3 Příručky pro žadatele OP VaVpl), Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se této veřejné zakázky.

- 13.4 Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, v platném znění, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- 13.5 Součástí smlouvy jsou její přílohy:

1. Technická specifikace (projektová dokumentace);
2. Položkový rozpočet
3. Časový plán realizace díla.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či rozporů mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující znění přílohy s vyšší prioritou, která je dána pořadovým číslem přílohy, kde 1 je nejvyšší.


- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

- 13.7 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Berlín

Datum: 12. 6. 2012

Objednatel

..... 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D, MBA,


kvestor

Masarykova univerzita

V Praha

Datum: 20. 6. 2012

Zhotovitel

(podpis) 

.....

.....

.....



* Celková koncepce řešení je nedílnou součástí architektonické, výtvarné a materiálové koncepce areálu UKB a vychází z "Koncepce barevného řešení areálu UKB". Barevné řešení vybavení je řešeno v souladu s celkovým výrazem pavilonu. Podtrhuje náplň a účel pavilonu - vědeckovýzkumná pracoviště vysoké školy. Základní ideou barevného řešení je pojetí v neutrálním tónu s tím, že barevným akcentem je zde mobiliářový detail.

* Organizace areálu UKB pomocí barevného řešení vychází z následujícího principu:

- primární barevnost - jednotná pro celý areál UKB a je dána materiálem a konstrukcí pavilonu
- sekundární barevnost - důležitá pro interiérovou část - je určena dle příslušného uživatele fakulty, který se v daném pavilonu nachází.

Barevnost použita na akcent mobiliáře:

- MU - CEITEC
- referenční barva základní části - lamino EGGER, FUNDERMAX, barva 0742 (Pebble Grey), včetně ABS hran
 - referenční barva barevné části - lamino KRONOSPAN, KAINDL, barva 7190 (Mamba Green), včetně ABS hran

Vzorkování nábytku:

* Typické nábytkové sestavy laboratorního a kancelářského nábytku budou vzorkovány za účasti uživatelů a autorského dozoru z důvodu prezentace specifických konstrukčních detailů jednotlivých prvků.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Všechny základní části a korpusy budou vyrobeny z laminovaných dřevařských desek LTD tloušťky 18 a 25 mm EGGER, FUNDERMAX, v barvě Pebble Grey 0742.

Barevně odlišena dle sekundární barevnosti pavilonu budou (dle výše uvedeného barevného řešení) čísla a horní pláta mobilního kontejneru, výškově stavitelné police nad pracovní plochou stolu, zadní čela a stavitelní police otevřených, uzavřených a prosklených skříní.

Z laminovaných dřevařských desek LTD tloušťky 18 mm KRONOSPAN, KAINDL v barvě Mamba Green 7190, budou výškově stavitelné police otevřených skříní bez dvířek, uzavřených skříní a skříní s prosklenými dvířky. Princip barevnosti nábytku je schématicky znázorněn na příkladu ukázkové sestavy a je součástí tohoto dokumentu.

Záda uzavřených skříní a skříněk budou z desky LTD tloušťky 8 mm, barva Mamba Green 7190, KRONOSPAN, KAINDL. Kombinované skříně - plná dvířka + prosklení, plná dvířka + nika budou mít společně záda barevná z laminovaných desek LTD (tl. 18 mm) v barvě korpusu.

Dvířka budou zavěšena na niklových závěsech odnímatelných bez šroubování s integrovaným systémem plynulého dovoření (např. Heftlich SENSYS, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku budou kovové plynový s plynulým dojezdem a dlouhou životností (např. Heftlich, Blum, Grass).

Úchytky kovové - barva přírodní elox. Tvar a technická specifikace úchytky je přílohou této technické zprávy. Úchytky na dvířkách skříněk a nástavců upevněné horizontálně z čela (Heftlich Prodecor - Eslinga, Capris), na kontejneru jsou úchytky tvořeny výřezem v čísku.

Průchodky pro kabeláž pro PC budou umístěny v zadní části pracovní desky, střed kruhové průchodky vždy 130 mm od zadní a 200 mm od boční hrany desky, materiál kovový odlitek, povrchová úprava elox.

Sokly skříněk kovové, výška 50 mm, s výškovou rektifikací.

Upozornění:


v případě skřínových sestav, kdy sloup zasahuje do korpusu nábytku, je nutné provést atypickou úpravu hloubky zadního čela a vložených polic skříní.

SEDACÍ NÁBYTEK

Nabízený vzorek výrobku musí přesně splňovat materiálovou specifikaci a dodržovat tvarové a konstrukční řešení tak, aby byl docílen celkový architektonický koncept návrhu. Jednotlivé prvky sedáčního nábytku musí splňovat kvalitativní (technickou a materiálovou), designovou úroveň referenčních typů.

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA + POPIS STANDARDU


šířka	450 mm
hloubka	650 mm
výška	640 mm



POPIS STANDARDU

- * Kontejner je z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda kontejneru pevná. Dvířka, čílko zásuvky a půda kontejneru s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hraný korpus kontejneru z materiálu ABS tl. 0,5 mm).
- * Pojezdy pro zásuvky kovové plnovýsuvy s dlouhou životností (např. Hettich, Blum, Grass).
- * Úchytky na zásuvkách kovové, broušený nerez pr. 10 mm, rozteč - 224 mm, výška úchytek od podlahy - 150, 290, 430, 570 mm (viz. strana II 06).
- * Čtyři šedá kolečka na tvrdý povrch, gumová výstelka měkčená pryž šedá, konstrukční výška 80 mm, z toho dvě s brzdou. Kolečka nesmí zanechávat stopy při smýkání.

ZOBRAZENÍ

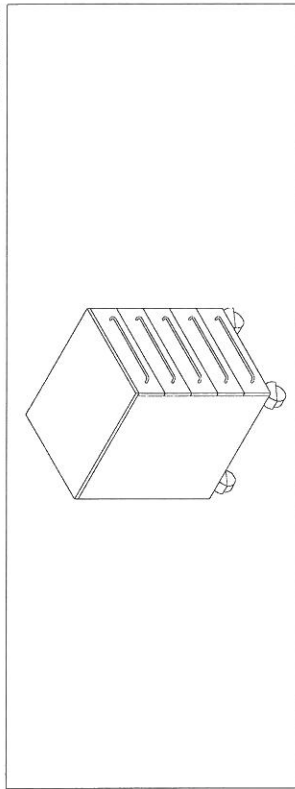

K2

kontejner zásuvkový, centrální zámek

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	01	II 04	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA + POPIS STANDARDU

šířka	600 mm
hloubka	320 mm
výška	480 mm



POPIS STANDARDU

- * Skříňka nástěnná je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Hrany dvířek s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm.
- * Dvířka na niklových závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum, apod.), úchytky na dvířkách kovové broušená nerez pr. 10 mm.
- * 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.
- * Uchycení police na stěně pomocí systémového závěsného kování na lištu.

N3

skříňka nástěnná, jednodveřová, 1x zámek

ROZMĚRY, PŮDORYSNÉ SCHÉMA + POPIS STANDARDU

šířka	900 mm
hloubka	320 mm
výška	480 mm



POPIS STANDARDU

- * Skříňka nástěnná je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Hrany dvířek s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm.
- * Dvířka na niklových závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum, apod.), úchytky na dvířkách kovové, broušená nerez pr. 10 mm.
- * 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.
- * Uchycení police na stěně pomocí systémového závěsného kování na lištu.



Skříňky nástěnné N3, N4

N4

skříňka nástěnná, dvoudveřová, 1x zámek

II 5

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PR. - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	01	II 05	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

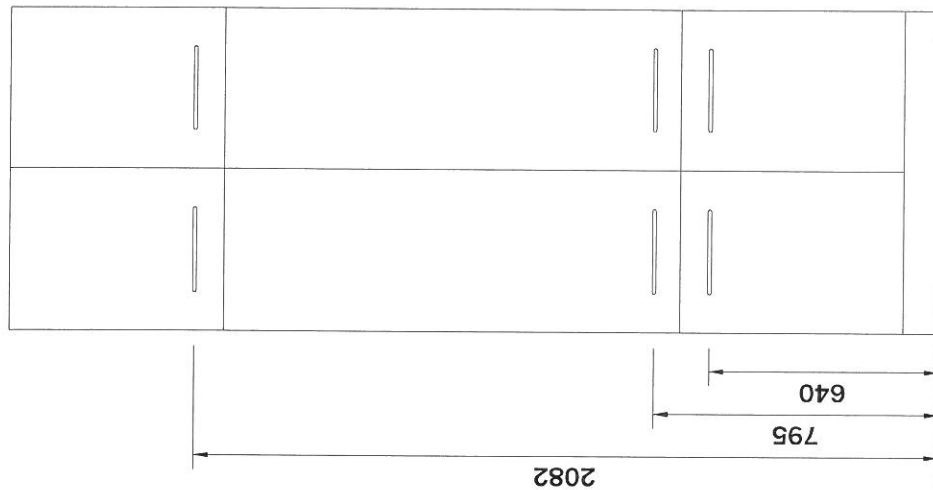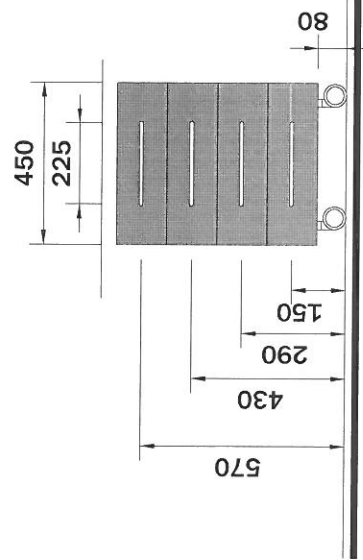

KONTEJNERY

SPODNÍ SKŘÍŇ v = 900 MM A VYSOKÉ SKŘÍŇ

Přehled roztečí a výškového umístění úchytok

II 6

STAVBA	STUPEN	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	1001	01	II 06	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

* Kolečková kancelářská čalouněná židle s područkami, výškově stavitelný sedák se synchronním mechanismem (ovládání plynovým pístem bez plastových krytek), individuální nastavení síly přítlaču opěrky, výškově stavitelná opěra s aretací v jakékoliv pozici, sedák nastavitelný v hloubce. Židle musí odpovídat ergonomické normě EN 1335. Volitelná barva čalounění sedáku (100% polyester). Podnož tvořená pěticramenným křížem z tlakově litého hliníku, povrch práškový lak RAL - 9006, pět koleček na tvrdý povrch pr. 65 mm, konstrukce šedý plast černá guma. Výškově a předozadně stavitelné područky a přednastavenou rektifikací, materiálová kombinace konstrukce područek leštěný kov a černý plast. Opěradlo flexibilní rámová konstrukce z polypropylenu, nebo hliníku umožňující hluboký úhel záklonu, šedé barvy, vyplň ze síťoviny šedé barvy (100% polyester). Konstrukce musí disponovat vysokou pružností, pevností a odolností proti oděru, kloubová spojka opěrky a stavitelného mechanismu kovová, povrch prášková barva RAL - 9006, nebo leštěný hliník. Výškově stavitelná opěra bederní páteře. Židle bude vybavena aktivní opěrkou hlavy, která podporuje hlavu v jakékoliv poloze v závislosti na opěradle, bez nutnosti dalšího nastavení. Mechanické vybavení židle umožňuje dynamické sezení.

Požadavky na materiály: čalounění gramáž 300 g/m², stálobarevnost v ořezu 4-5 dle EN ISO 105-X12, odolnost proti žmolkování 4-5 dle EN ISO 12945-2.

Požadavky na certifikaci: GS certifikát bezpečného výrobku.

(např. Kastel - Korium, Bene - modus Comforto 88, Sedus - Open Up, Vitra - Head Line)

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

minimální výška sedáku	420 mm
maximální výška sedáku	540 mm
minimální výška opěry	1 100 mm
maximální výška opěry	1 220 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

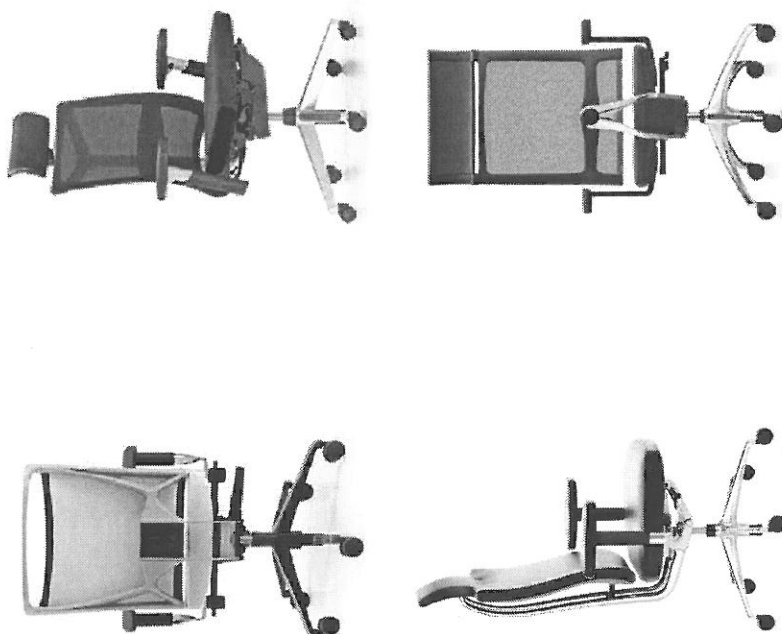

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

Židle kancelářská - zaměstnanci

ŽK 2

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PRVKU	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	05	011	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION


POPIS STANDARDU

- * Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňe LTD tl. 8 mm, do drážky v sekundární barevnosti.
- * Dvířka na niklováných závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum apod.) s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříňe a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm).
- * Skříň osazena na výškové stavitelných plastových nožkách s hladkým povrchem umožňující v prostoru pod skříní snadné čištění.
- * Odnímatelný plastový sokl s měkkým transparentním těsněním - povrchová úprava broušený nerez v = 100 mm, napojení rohů pod úhlem 45° s vlnitým výztužným profilem.
- * Jednodveřová skříň, 5 stavitelných polic s podpěrkami proti vysunutí, 1x zámeček.
- * Nástavec jednodveřový, 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí, 1x zámeček.
- * Úchytky na dvířkách - matný chrom, rozteč 352 mm, výška osy úchytky nad podlahou - 907 a 2080 mm.
- * Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách a být ve shodě s EN 14 056.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

B - hloubka 620 mm




POZNÁMKA

* standard se skládá z následujících částí - část "a" (skříň) a část "b" (nástavec)


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	600 mm
hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	600 mm
hloubka	420 mm
výška	600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

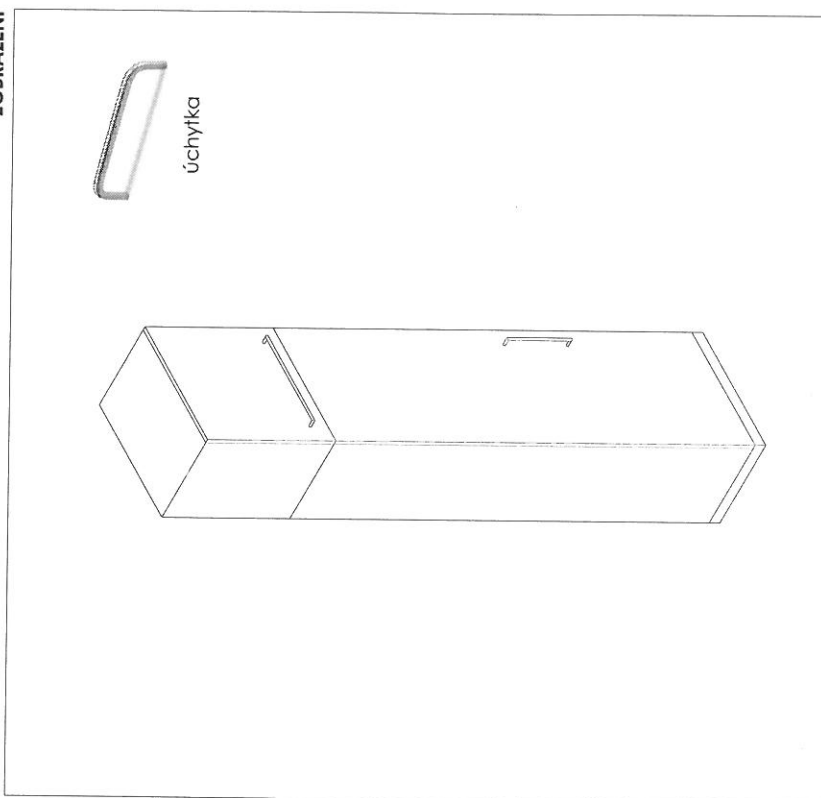

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň laboratorní

60

STAVBA	SLUPKA	ČÍSLO PL. SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	01	060	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION


POPIS STANDARDU

- * Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňě LTD tl. 8 mm, do drážky v sekundární barevnosti.
- * Dvířka na niklových závěsech, odhmatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum apod.) s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříňě s hranou z materiálu ABS 0,5 mm).
- * Skříň osazena na výškové stavitelných plastových nožkách s hladkým povrchem umožňující v prostoru pod skříní snadné čištění. Odhmatelný plastový sokl s měkkým transparentním těsněním - povrchová úprava broušený nerez v = 100 mm, napojení rohů pod úhlem 45° s vnitřním výztužným profilem.
- * Skříň rozdělená na dvě části, horní dvoudveřová, prosklená dvířka v hliníkovém rámu, 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí, spodní dvoudveřová (výška od podlahy - 722 mm), plná dvířka, 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. 2x zámek.
- * Nástavec dvoudveřový, 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí, 1x zámek.
- * Úchytky na dvířkách - matný chrom, rozteč 224 mm, výška osy úchytky nad podlahou - 624 a 2080 mm.
- * Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách a být ve shodě s EN 14 056.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

B - hloubka 620 mm




POZNÁMKA

* standard se skládá z následujících částí - část "a" (skříň) a část "b" (nástavec)


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	900 mm
hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	900 mm
hloubka	420 mm
výška	600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

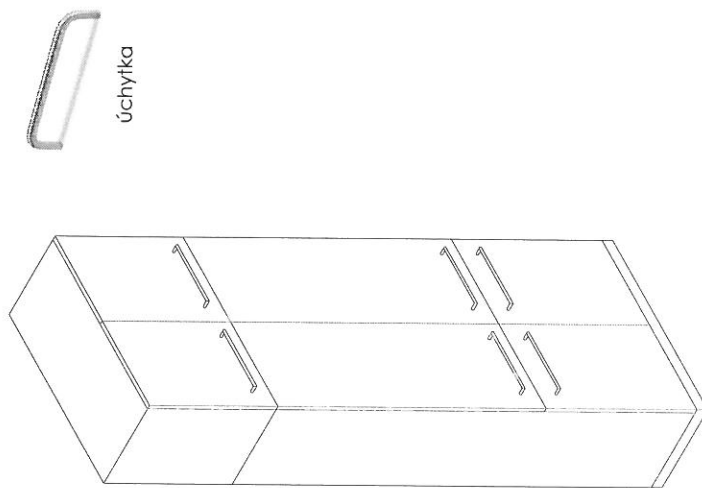

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň laboratorní

63

STAVBA	SLUPK	ČÍSLO PL-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	01	063	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION


POPIS STANDARDU

- * Dřevěná konstrukce, 5 pevných polic z LTD II, 25 mm, nosnost police 50 kg.
- * Kovové součásti konstrukce minimalizovány (blízkost magnetů NMR).
- * Kotvení do zdi ve výšce 2000 mm
- * Barva šedá, blízka RAL 7040.
- * Police označeny štítkem s udáním maximální nosnosti.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka 1000 mm
hloubka 600 mm
výška 2000 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

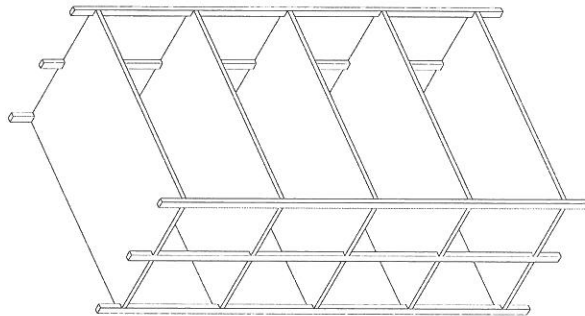

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

regál policový dřevěný

72

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PR.-3D	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	05	072	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TILE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU


- * Laboratorní dvoudveřová chladnička kombinovaná s čistým objem mrazničky 240 litrů, čistým objemem mrazničky 105 litrů.
- * Chladicí teplota v rozmezí +3° C až +8° C, mrazicí teplota v rozmezí -9 až -30° C, zobrazení vnitřní teploty a její ovládání z venku lednice, senzor nechtěného otevření dveří (akustický a vizuální) společně s hláskem výpadku dodávky elektrické energie, automatické odmrazování chladničky, odmrazování mrazničky manuální, maximální spotřeba elektrické energie za 24h - 1,8 kWh.
- * Samozavírací dveře s možností uzamknutí a stranové zaměnitelnosti otvírání, uvnitř chladicí části 4 vnitřní police z tvrzeného skla s možností výškového nastavení, uvnitř mrazicí části 3 zásuvky.

REFERENČNÍ VÝROBEK: Liebherr LCv 4010

ROZMĚRY

šířka	600 mm
hloubka	615 mm
výška	2000 mm

ZOBRAZENÍ



100

laboratorní chladnička kombinovaná

Chladničky a mrazničky

100

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZIE
CEI	DPV	1 001	05	100	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

*Odpadkový koš laboratorní, objem 12 l, víko ovládané nožním pedálem, vyjímatelná plastová nádoba. Materiál nerez leštěný. (např. Merida KT 101)




ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

průměr _____ 250 mm
výška _____ 390 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

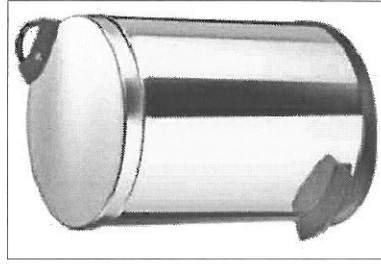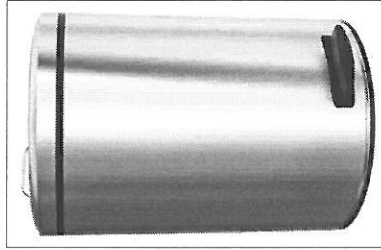

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

odpadkový koš laboratorní - malý

187

STAVBA	STUPEN	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIE
CEI	DPV	I 001	05	187	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

- * Laminovaná dřevotřísková deska opatřená ABS hranou kotvená hmoždinkami a vruť se zápusťnými imbusovými hlavami do stěny.
- * Věšáky z extrudovaného hliníkového profilu, kotvené na hmoždinky s pohledové skrytými vruť - na stěně osazený celkem 3 věšáky.
- * Šatní stěna osazena horní hranou do výšky 2020 mm nad podlahu (spodní hrana je zarovnána k horní hraně soklu podlahy- přesný rozměr přizpůsobit dle výšky soklu).



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	500 mm
hloubka	18 mm
výška	1970 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ



POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

šatní stěna

191

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	05	191	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

* Výškově stavitelná podnož s plynulým zdvihem, nohy typu C, barva konstrukce RAL 9006, nastavitelný zdvih (minimální požadovaný rozsah výšky stolu 680 - 880 mm), variabilní stavitelná příčná spojka a nosníky pro montáž pracovní desky, nohy podnože musí lícovat s boční hranou pracovní desky, systémový kabelový žlab drátěný (minimálních rozměrů) po celé šířce stolu, rekifikace pro vyrovnání nerovností podlahy, ovládání mechaniky zdvihu jednou osobou, pomoci dobře přístupného systémového elementu, systém musí umožňovat funkční rohové provedení ve stejném designu. Podnož nesmí ve své minimální poloze kolidovat s výškou mobilního kontejneru. Výrobek musí být certifikovaný z hlediska chemické nezávadnosti, mechanických vlastností a bezpečnosti. (např. Kesseböhmer - TM Q71, König+Neurath, Bene T-liftdesk, OMT Veyhl)

* Pracovní deska tl. 25 mm LTD 750 x 1500 mm, hrana ABS tl. 2 mm.

* Kabelová průchodka kovový odlitek, eloxovaný povrch ø 60 mm; v pracovní desce umístěny dva kusy. (např. Hettich).

* Systémový závěsný držák pro uchycení PC je určen k našroubování pod pracovní stolovou desku. Konstrukce držáku umožňuje

uchycení různých towerových jednotek (minimální požadovaný rozsah 400 - 600 mm). Konstrukce držáku nesmí kolidovat se spojkou podnože a musí být umístěna tak, aby uchycené PC nepřesahovalo přední hranu pracovní desky. Držák je stavitelný na výšku, šířku a hloubku. Materiálově se jedná o konstrukci z kovových profilů popř. plastových výlisků. Referenční barva RAL 9006, (PC Pro - Hettich, Bene, Kesseböhmer, Häfele)


* Mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou š. 430, hl. 550, v. 580 mm, tři zásuvky s kovovými plnovýšuvy a integrovaným plynulým dojezdem (např. Blum, Hettich), vnitřní světlý rozměr zásuvky musí umožňovat uložení standardního formátu A3, horní zásuvka s integrovanou výšuvnou tužkovnicí ukrytou za společné čtvero, uchytíky tvořené výřezy v čláčkách zásuvek, korpus a čtvero vyrobená z LTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 mm, centrální uzamykání s mechanismem blokování zásuvek proti převrácení kontejneru, čtyři nábytková kolečka Rotola hliník a šedá guma, max. výška včetně kolvení 125 mm (např. Demos Rotola.)

* Multifunkční držák LCD monitoru s úhlopříčkou maximálně 24" pro zapuštění do pracovní desky stolu. Ocelová konstrukce, nosnost držáku 8 kg. Umožňuje seřízení výšky a sklonu k ergonomickému přizpůsobení pracovní pozice, otáčení o 360°. Barevné provedení stříbrná a černá. Dva typy montážních desek VESA 75 a 100. Držák musí systémově řešit i přístup kabeláže pracovní deskou. (např. Artica Mono - Hettich).

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


šířka 1500 mm
hloubka 750 mm
výška stolu 680 - 880 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



206

ZOBRAZENÍ

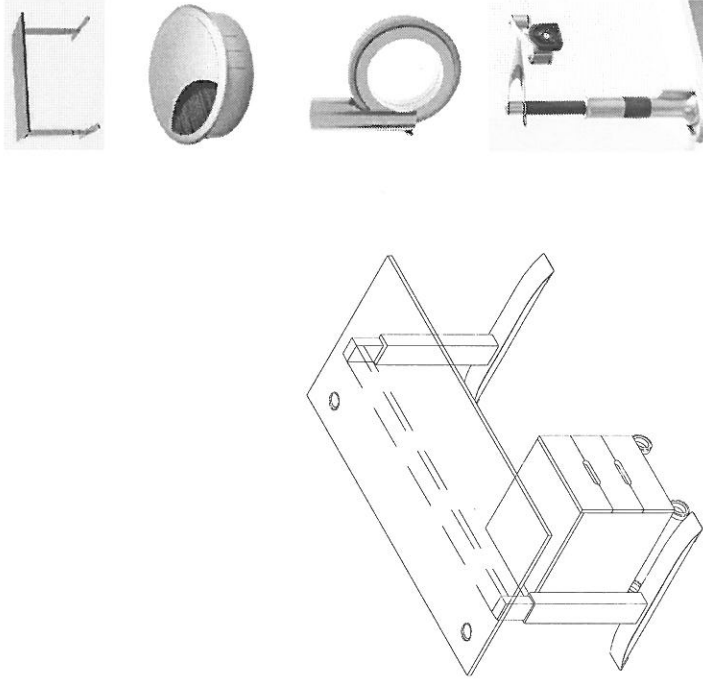

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

stůl psací sestava

206

STAVBA	STUPĚN	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	05	206	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

- * Skříň z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm - základní barevnost, záda skříňe a nástavce LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti.
- * Dvířka na niklovaných závěsech s plynulým dovíráním, odtímatelných bez šroubování (např. Heftlich Sensys, Blum, Grass) s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříňe a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné hliníkové, pohledová šířka profilu úchytky 40 mm, povrch eloxovaný hliník. (např. Heftlich Pro Decor - Eslinga).
- * Skříň - jednoduchá, 5 stavitelných polic s podpěrkami proti vysunutí v sekundární barevnosti, 1x zámek.
- * Nástavec - jednoduchý, 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí v sekundární barevnosti.
- * Soki skřínky - v = 50 mm - kovový; rektifikovatelný.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


šířka	800 mm
hloubka	420 mm
výška	2000 mm
šířka	800 mm
hloubka	420 mm
výška	600 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



221

ZOBRAZENÍ

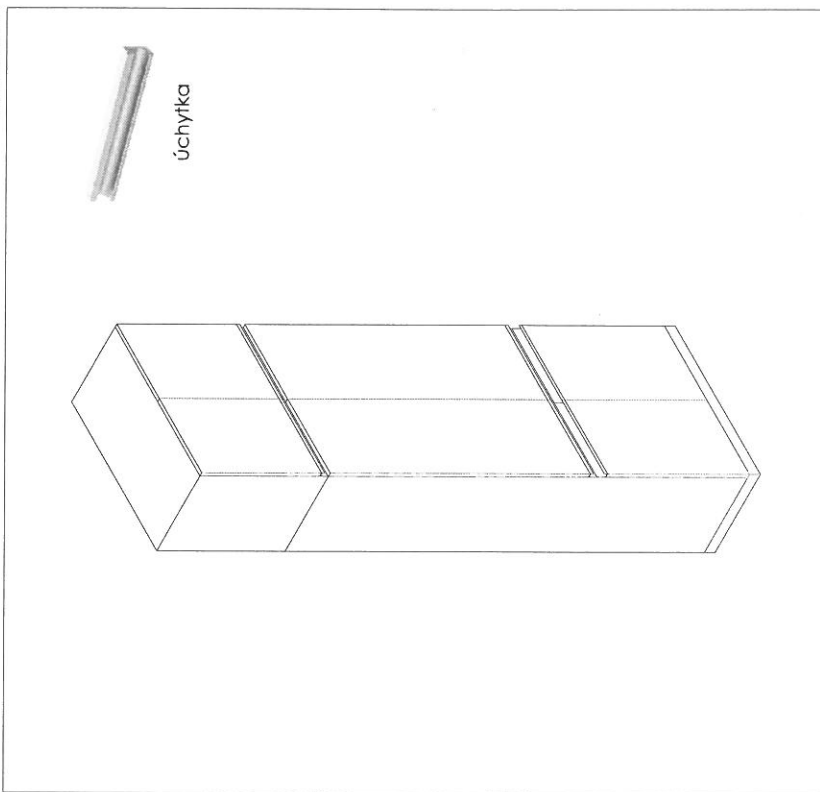

úchytka

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

skříň kancelářská

221

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZIE
CEI	DPV	I 001	05	221	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION


POPIS STANDARDU

- * Pracovní deska stolu z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm - základní barevnost , s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm. Průchodka pro kabeláž na středové ose pracovní desky, průměr 80 mm, kovová, materiálu eloxovaný hliník
- * Stolní kovová podnož s bočním stoupacím vodičem kandelákem pro kabeláž a horizontálním kabelovým roštem (žlabem). Výškově rektifikovatelná. Barva bílá RAL 9006.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka 1200 mm
hloubka 600 mm
výška 750 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

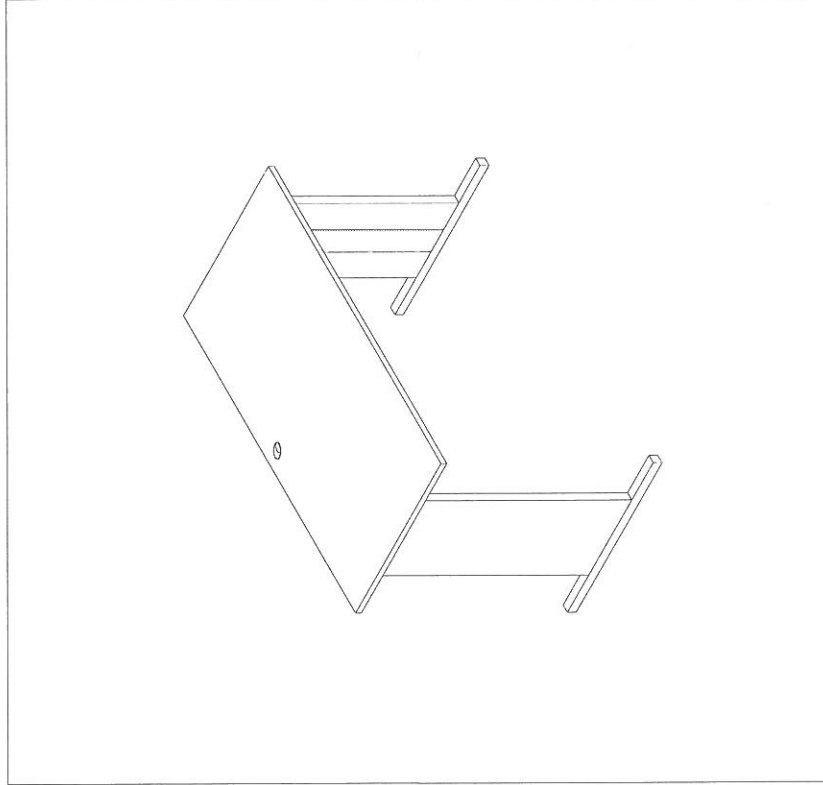

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

B - hloubka 750 mm

311//

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

stůl žákovský

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VTYKES	REVIZIE
CEI	DPV	I 001	05	311	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

311


POPIS STANDARDU

- * Stůl pracovní s LTD pracovní deskou tl. 25 mm atypického tvaru. Šest kovových stolových noh $\varnothing 60$ mm s velkým rozsahem seřízení (100 mm) a krycím pouzdrům; povrchová úprava nerezový finiš.
- * Kabelový žlab pod stolovou deskou, kabelové průchodky, kovový odlitek, eloxovaný povrch $\varnothing 60$ mm; v pracovní desce umístěny tři kusy. (např. Heftich).
- * Výrobek musí být certifikovaný z hlediska chemické nezávadnosti, mechanických vlastností a bezpečnosti. Barva podnože RAL 9006.


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	2650 mm
hloubka	800 mm
výška	700 - 820 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

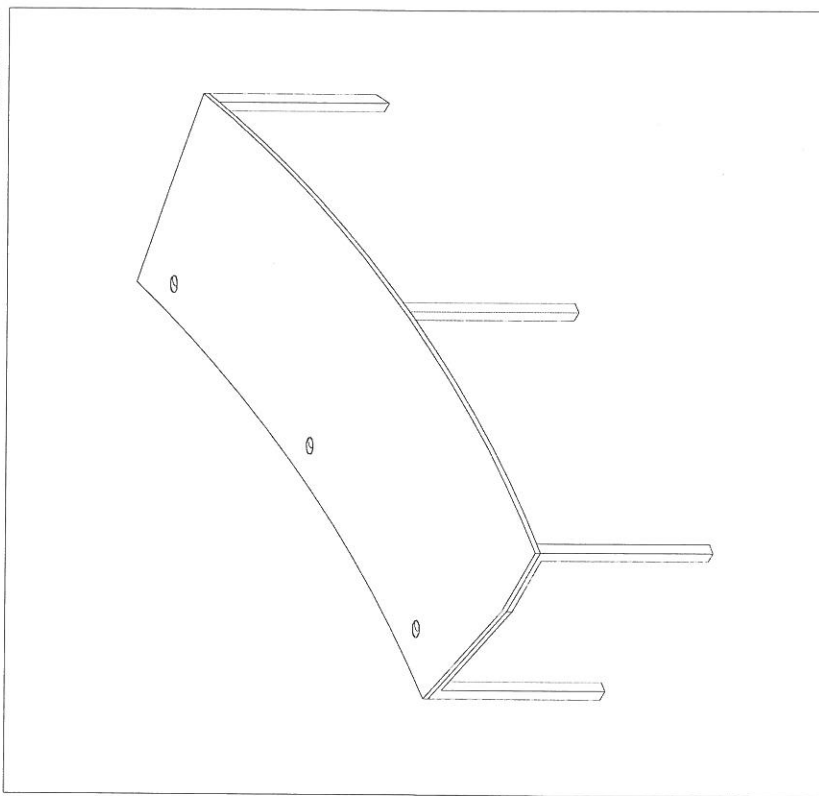

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

stůl pracovní - operátor NMR

315

STAVBA	STUPEN	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	05	315	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

POPIS STANDARDU

* Dřevěná pracovní plošina k magnetům NMR. Vlastní plošina 520 x 520 mm, v. 680 mm plus dva schody (rozměr stupně 520 x 230 mm).

* Celá plošina vyrobena z masivu bez použití kovového spojovacího materiálu.


* Barva RAL 9006, v rámci vzorkování může být barva změněna jiný odstín RAL.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


šířka _____ 520 mm
hloubka _____ 950 mm
výška _____ 680 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

316



ZOBRAZENÍ

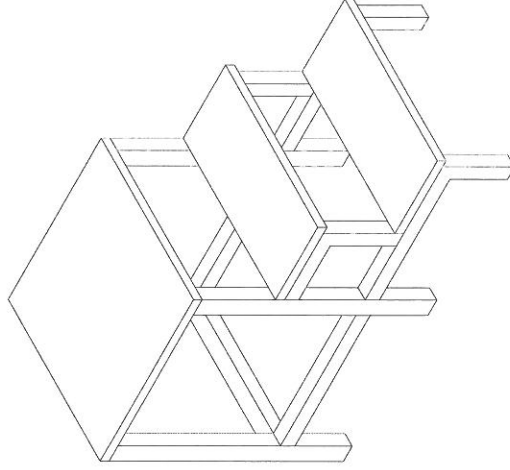

POZNÁMKA

OZNAČENÍ / NÁZEV PRVKU

dřevěná pracovní plošina

316

STAVBA	STUPEN	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
CEI	DPV	I 001	05	316	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

I - CEITEC - PŘÍSTAVBA A4 NMR

PO VKU	Popis	Cena za ks bez DPH	POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Cena celkem bez DPH
-----------	-------	-----------------------	---------------	----------	------------------------

IS45 - magnet 500

					sedací
ŽK2	Kancelářská židle Storm 555 N2 TI + BR 550 + F50 N2 + BO	11 595,00	2		23 190,00 Kč

IS102 - laboratoř

					laboratorní
60/B	Skříň laboratorní LTD Egger U708 + Kronospan Mamba Green	7 850,00	1		7 850,00 Kč
63/B	Skříň laboratorní LTD Egger U708 + Kronospan Mamba Green	9 946,00	1		9 946,00 Kč
316	Dřevěná pracovní plošina	3 272,00	2		6 544,00 Kč

Pozn. : v rámci dodávky prvků 316 bude proveden nátěr stávající pracovní plošiny do RAL 3003.

IS104 - operátor

					kancelářský
100	Laboratorní chladnička Liebherr Lcv 4010	38 771,00	1		38 771,00 Kč
187	Odpadkový koš, nerez, s vyjímatelnou plastovou nádobou	404,00	2		808,00 Kč
191	Šatní stěna	765,00	2		1 530,00 Kč
206	Stůl psací, sestava	19 210,00	5		96 050,00 Kč
221	Skříň kancelářská	7 020,00	3	blendáž	21 060,00 Kč
311/B	Stůl žákovský	2 535,00	1		2 535,00 Kč
315	Stůl pracovní - operátor NMR	4 860,00	1		4 860,00 Kč
K2	Kontejner zásuvkový, centrální zámek	7 290,00	1		7 290,00 Kč
N3	Skříňka nástěnná jednodveřová, 1x zámek	2 150,00	4		8 600,00 Kč
N4	Skříňka nástěnná dvoudveřová, 1x zámek	2 480,00	2		4 960,00 Kč

					sedací
ŽK2	Kancelářská židle Storm 555 N2 TI + BR 550 + F50 N2 + BO	11 595,00	7		81 165,00 Kč

IS106 - sklad

					laboratorní
72	Regál policový dřevěný	5 135,00	5		25 675,00 Kč

Celkem bez DPH	309 794,00
DPH celkem	61 958,80
Celkem včetně DPH	371 752,80

podpis smlouvy
výroba
montáž
finalizace
předání

on
den
y. den
en
